


# Randstad 380 Zuidring Spoorboekje vergunningentraject

Versie 1 maart 2010

BEP = Bureau Energieprojecten  
 BG's = bevoegde gezagen  
 Cmer = Commissie voor de milieueffectrapportage  
 EZ = Ministerie van Economische Zaken  
 TT - TenneT  
 VROM = Ministerie van VROM  
 ROv = leden Regio-overleg

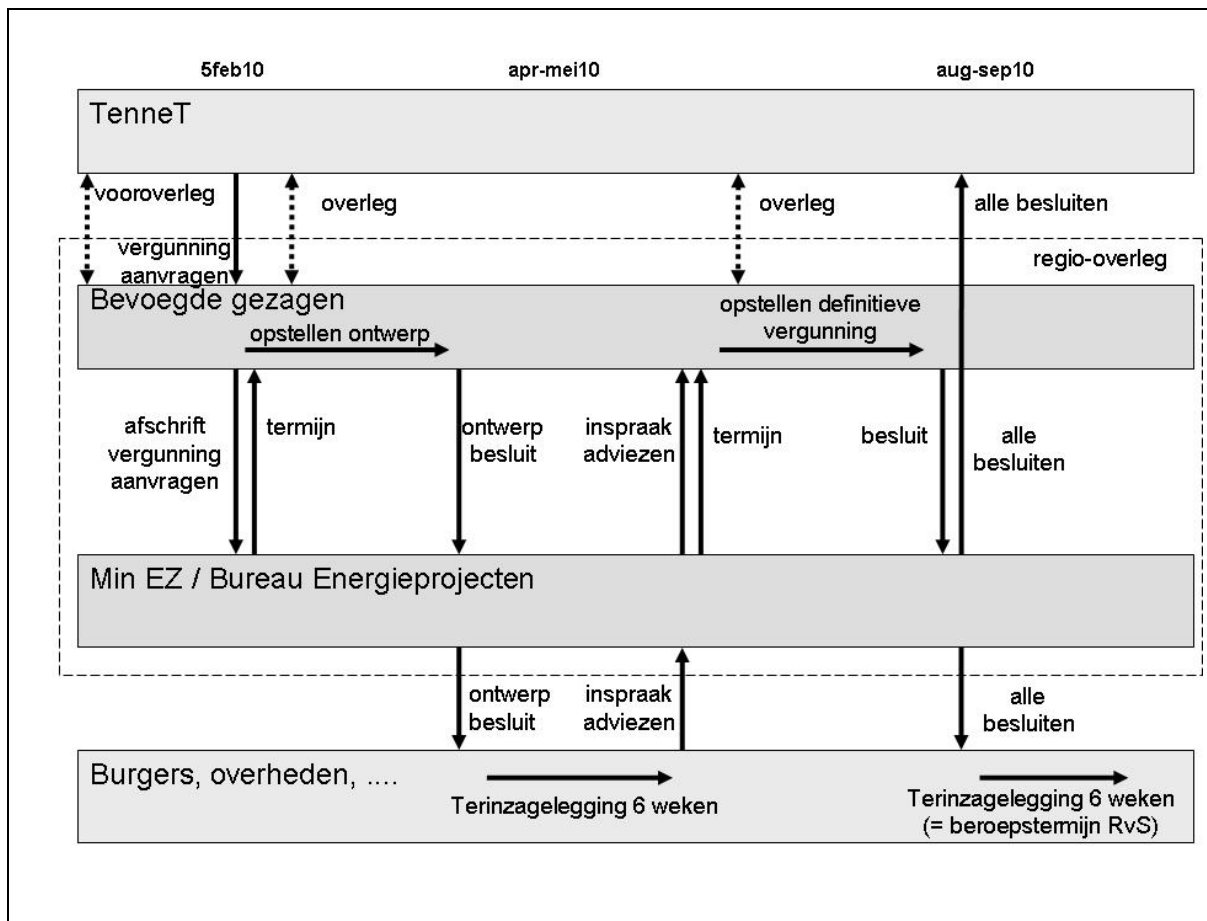

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	2010				2011				2012					
					kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4		
1	Zuidring concept planning 2e uitvoeringsmodule v1mr10																	
2	<b>Regio-overleggen</b>	<b>195 dagen</b>	<b>don 14-1-10</b>	<b>don 14-10-10</b>														
3	regio-overleg 1 (startbijeenkomst)	0 dagen	don 14-1-10	don 14-1-10														
4	regio-overleg 2 (over ontwerpbesluiten en informatieavc	0 dagen	don 11-3-10	don 11-3-10														
5	regio-overleg 3 (over inspraak en besluiten)	0 dagen	don 17-6-10	don 17-6-10														
6	regio-overleg 4 (over beroepen en/of afronding)	0 dagen	don 14-10-10	don 14-10-10														
7	<b>Uitvoeringsbesluiten</b>	<b>162 dagen</b>	<b>vri 5-2-10</b>	<b>din 21-9-10</b>														
8	indienen vergunningaanvragen	0 dagen	vri 5-2-10	vri 5-2-10														
9	indienen aanvullend archeologie onderzoek	0 dagen	don 25-3-10	don 25-3-10														
10	EZ ontwerp aanlegvergunning klaar	10 dagen	don 25-3-10	woe 7-4-10														
11	opstellen ontwerp-vergunningen	8 wkn	maa 8-2-10	vri 2-4-10														
12	voorbereiding terinzagelegging	7 dagen	don 8-4-10	vri 16-4-10														
13	<b>TERINZAGELEGGING ONTWERP-BESLUITEN</b>	<b>6 wkn</b>	<b>din 20-4-10</b>	<b>maa 31-5-10</b>														
14	organiseren informatieavonden	4 wkn	din 20-4-10	maa 17-5-10														
15	verwerking inspraak in besluiten	8 wkn	din 1-6-10	maa 26-7-10														
16	voorbereiden terinzagelegging	2 wkn	din 27-7-10	maa 9-8-10														
17	<b>TERINZAGELEGGING BESLUITEN</b>	<b>6 wkn</b>	<b>woe 11-8-10</b>	<b>din 21-9-10</b>														
18	<b>Beroepsfase uitvoeringsbesluiten</b>	<b>520 dagen</b>	<b>woe 22-9-10</b>	<b>din 18-9-12</b>														
19	Rechtbank besluit op voorlopige voorzieningen	4 mndn	woe 22-9-10	din 11-1-11														
20	maken verweerschrift	3 mndn	woe 12-1-11	din 5-4-11														
21	opstellen uitspraak Rechtbank	6 mndn	woe 6-4-11	din 20-9-11														
22	RvS besluit op voorlopige voorzieningen	4 mndn	woe 21-9-11	din 10-1-12														
23	maken verweerschrift	3 mndn	woe 11-1-12	din 3-4-12														
24	opstellen uitspraak RvS	6 mndn	woe 4-4-12	din 18-9-12														
